


货物进场、吊装、库房方案

- 1, 主干路运输示意图（见下图）
- 2, 货物进场路线示意图（见下图）可有多条路线
- 3, 发货日期：按照合同要求或和甲方协商
- 4, 照明：不允许用临时照明，以防发生危险，建议安装专用照明；
- 5, 货物进场（卸货）时间表---工作时间：

	晚上	上午
周一到周六	20:00---次日 2:00	4::00---7： 30

- 6, 现场卸货工作人员组织图：

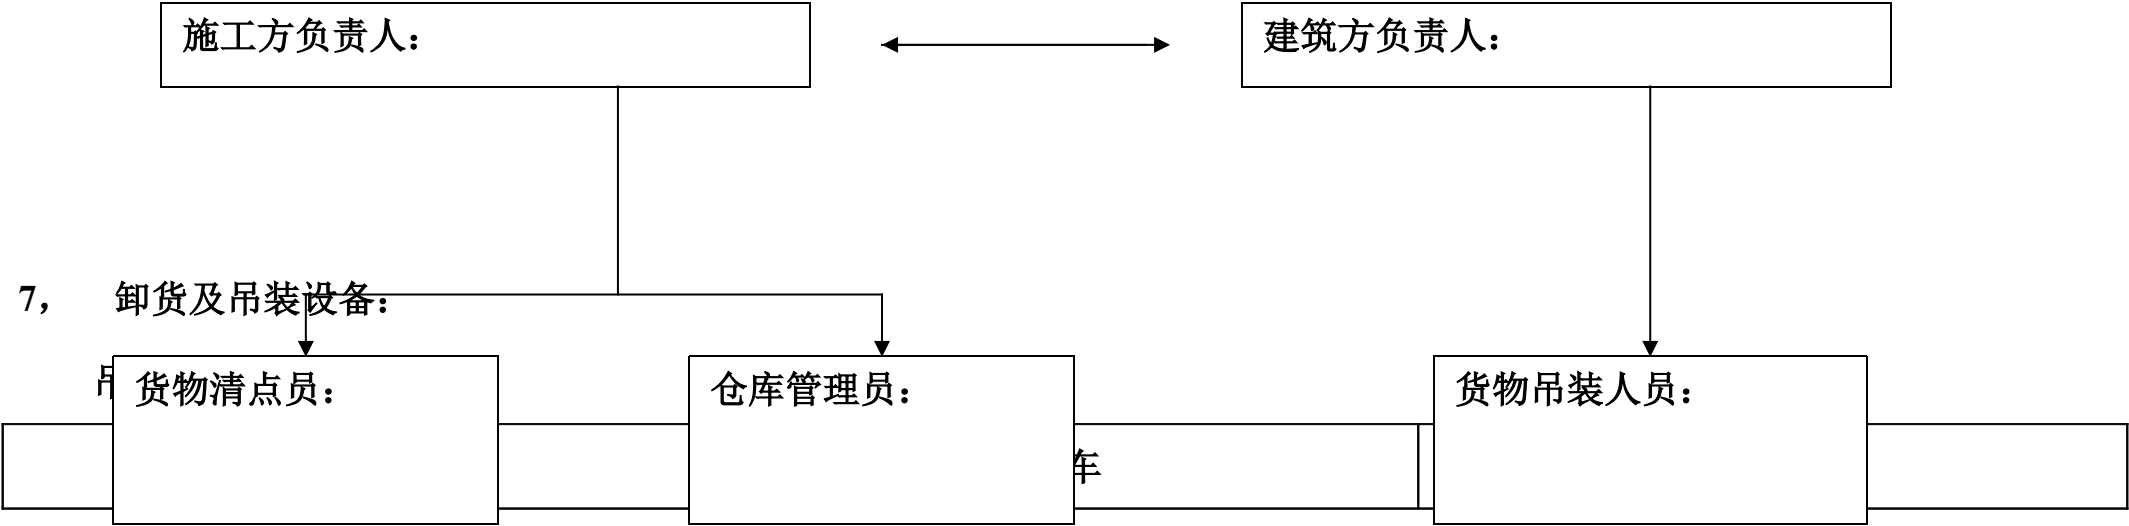

- 7, 卸货及吊装设备：

1 至 2 辆	5 台	1 架
---------	-----	-----

8， 摆放：

放于仓库（不超过两层）：	机械部件一；机械部件二；电气及钢带； <u>对重块（放于仓库最里面）；导轨（放于仓库最外面）</u> ；前壁；装潢；轿厢；
吊放于安装井道顶层：	机组；轿底；
13 台电梯	占地约 150 个箱子，场地占地过大，视现场库房大小及合同要求可分批到货
<u>仓库（由于工期、施工地点的不同，仓库需时刻转移到安装工地旁边）</u>	仓库，办公室必须有灭火器 事先做好摆放标记，方便直接放到摆放区域； 大箱子放在下面； 重物放在下面； 摆放场地不足时，可放于楼层上，但是要事先注意层楼承重压力； 自动扶梯尽量放于安装地点旁边，注意摆放地板要平整，以防长时间摆放而发生扭曲，注意防火；

9， 吊装方案：

根据合同要求，运输公司必须将货物卸载到指定地点，，我们帮忙是为了指挥

而已，公司将有运输卸货合同，没有卸载到指定地点，是违反合同。

若货物损坏要拍照并追溯赔偿责任；

10， 安全方案和措施

- 1.电梯货物堆放场地有甲乙双方共同派人看守，管理相关物品。
2. 甲方有义务为乙方提供相关保安协助，并提供各种防护栏及防护告示。
3. 对电梯货物在各个位置的摆放做好登记，利于检查。
4. 仓库做好防火，防盗和防潮湿，而且要保证有专人看守。
- 5， 进场卸货时，安全帽要带好；

紧急措施：送往高德医院（见货物进场路线示意图）

现场紧急救援负责人：

北

华南干线

渔东路

渔兴路

渔沙坦商场

龙洞步行街

高德中心

路运输线路示意图

渔兴路口

龙洞北

龙洞东路

